

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósuló vízügyi beruházások aktualitásai

Fülöp Szilárd

2019. július 4.



Ágazati KEHOP források

KEHOP-1.1.0 Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés (9.100 M) – (VGT, ÁKK, Balaton 120)

KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (280 M) – (Duna Múzeum)

KEHOP-1.3.0 – 1.3.1 Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása (121.272 M) – (Sió-Balaton, Velencei-tó, Mosoni Duna torkolati mtgy, RSD-Tass leeresztő műtárgy...)

KEHOP-1.4.0 - Árvízvédelmi fejlesztések (165.105 M) – (Tisza-Túr tározó, Hullámtér rendezések, kiépítés MÁSZ-ra, védképesség fejlesztés...)


KEHOP-1.5.0 - Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése (13.060 M) – (Dozmat, Magyarország...)

KEHOP-3.3.0 - Szennyezett területek kármentesítése (10.850 M) – (Szekszárdi lőtér, Gyálai Holt-Tisza)

~320 Mrd - Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK)

A beruházások ütemezése 2016-2023 között – Státusz 2019.07.04

- 51 beruházás (2 lezárva, 2019-ben 9 zár - ~50 Mrd)
- Összesen 454 beszerzési/közbeszerzési/in-house eljárás kerül lefolytatásra (387 megkötve – 85,24%) – OVF 333
- Kivitelezés 56 (megkötve 49)
- In-House 81 (megkötve 78)
- Szerződésállomány 278.166 M (87%)
- Lehívás - 185 Mrd (~45%)
- Teljesítés - 73 Mrd (~23%)

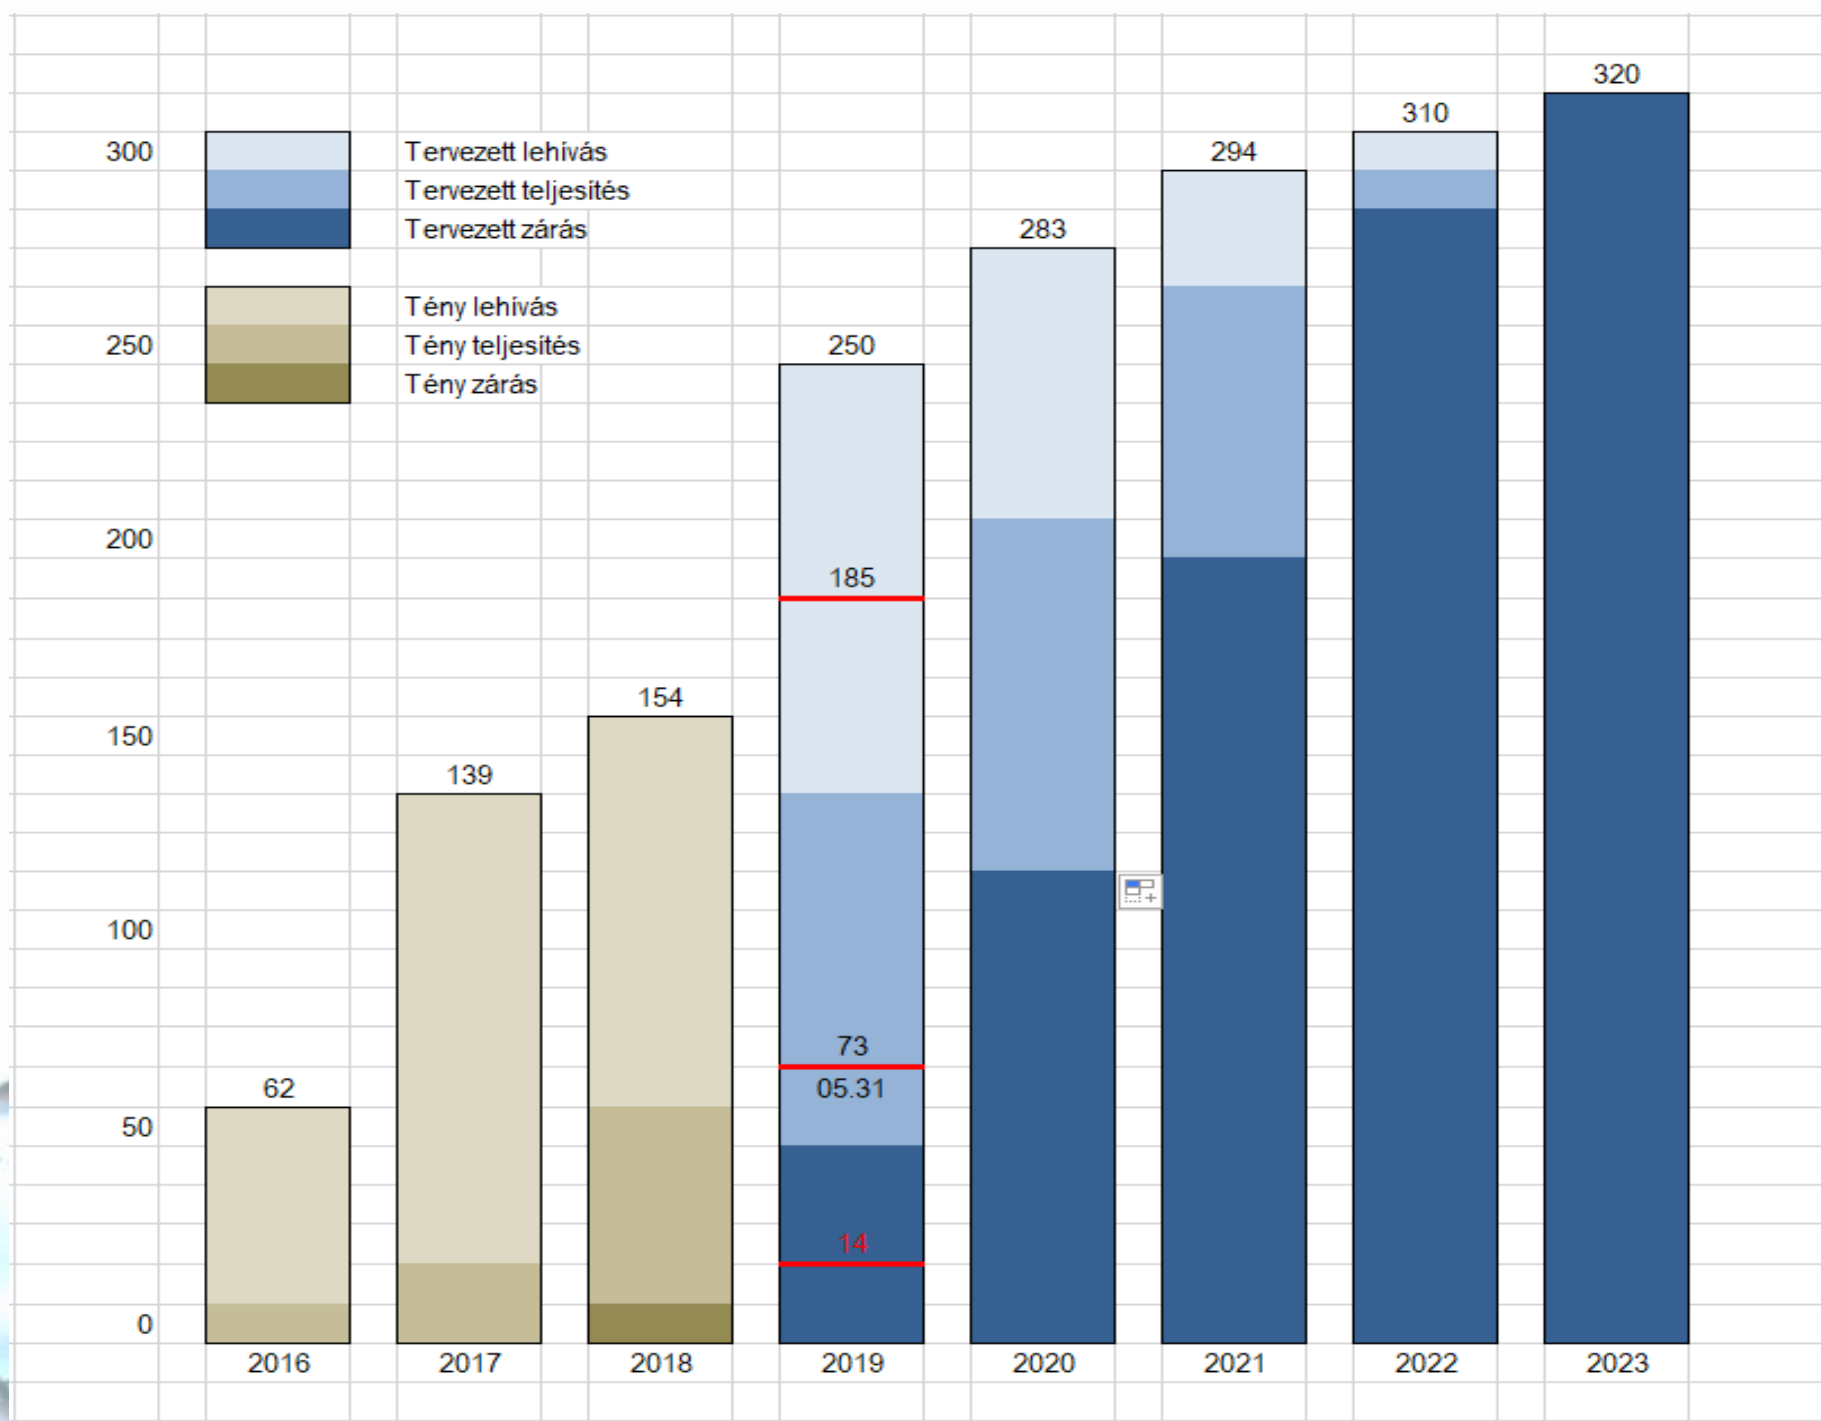

Lebonyolítói szervezet 2019.01.01-től


- Országos Vízügyi Igazgatóság – kedvezményezett, projektmenedzsment
- Vízügyi Igazgatóságok – kedvezményezett, projektmenedzsment
- Viziterv Environ Kft. – projektmenedzsment, tervező, mérnök
 - 2005.12.27 - alakulás – magánszemélyek
 - 2016.12.22 – tulajdonos váltás – Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.)
 - 2018.06.26 – 1/2018 (VI. 25.) NVTNM rendelet - tulajdonosi joggyakorló OVF










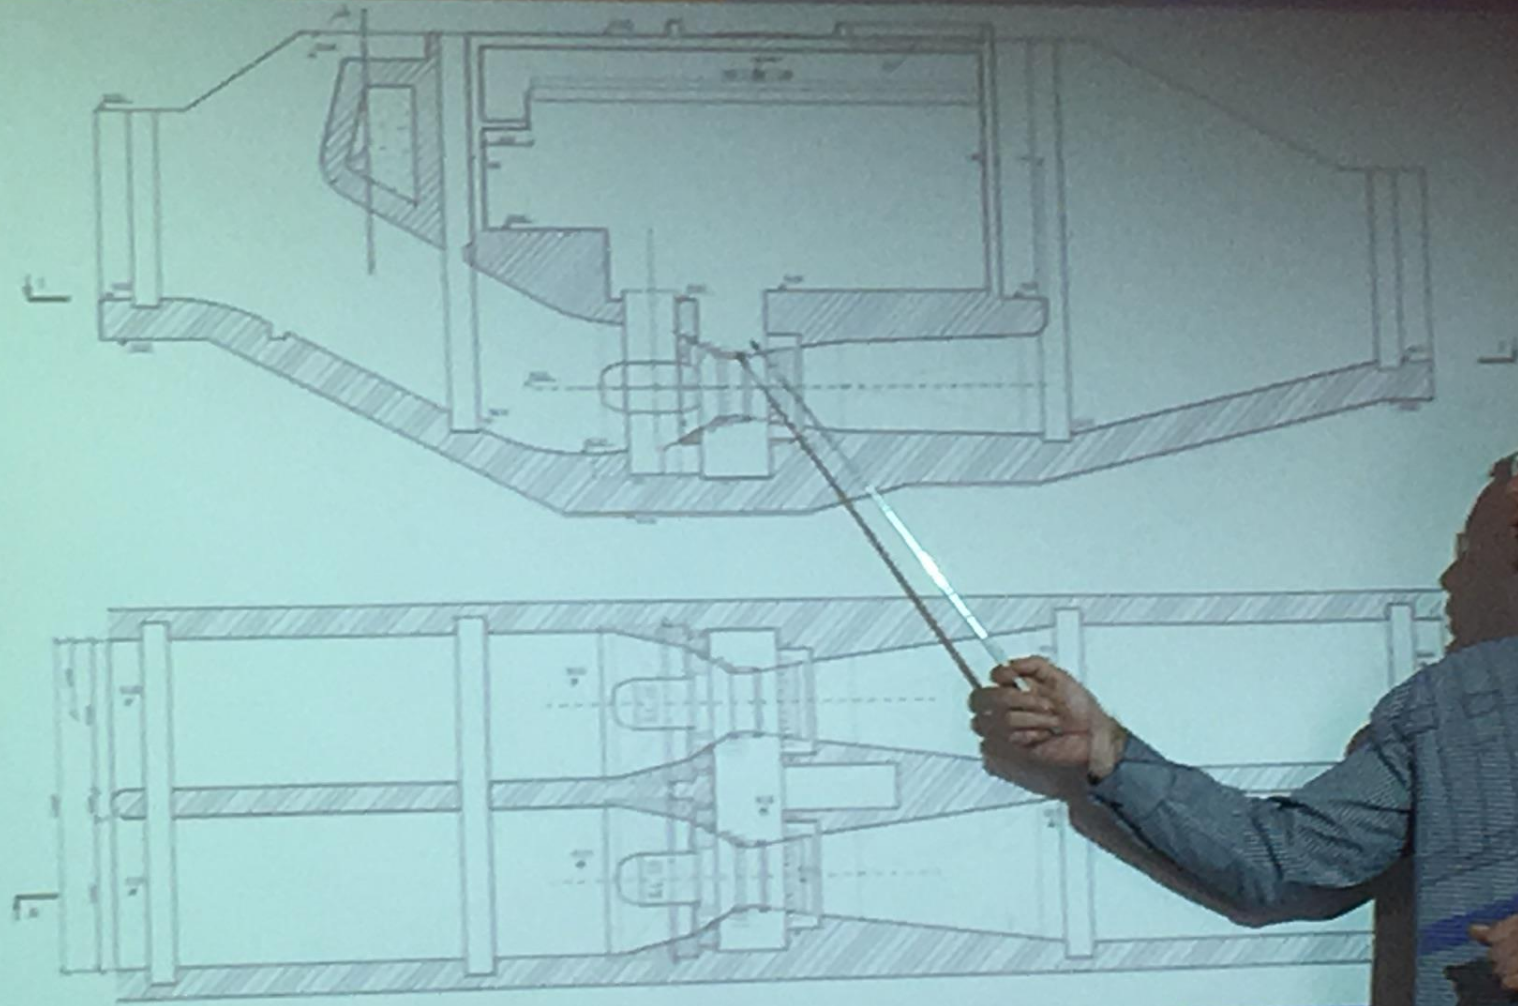














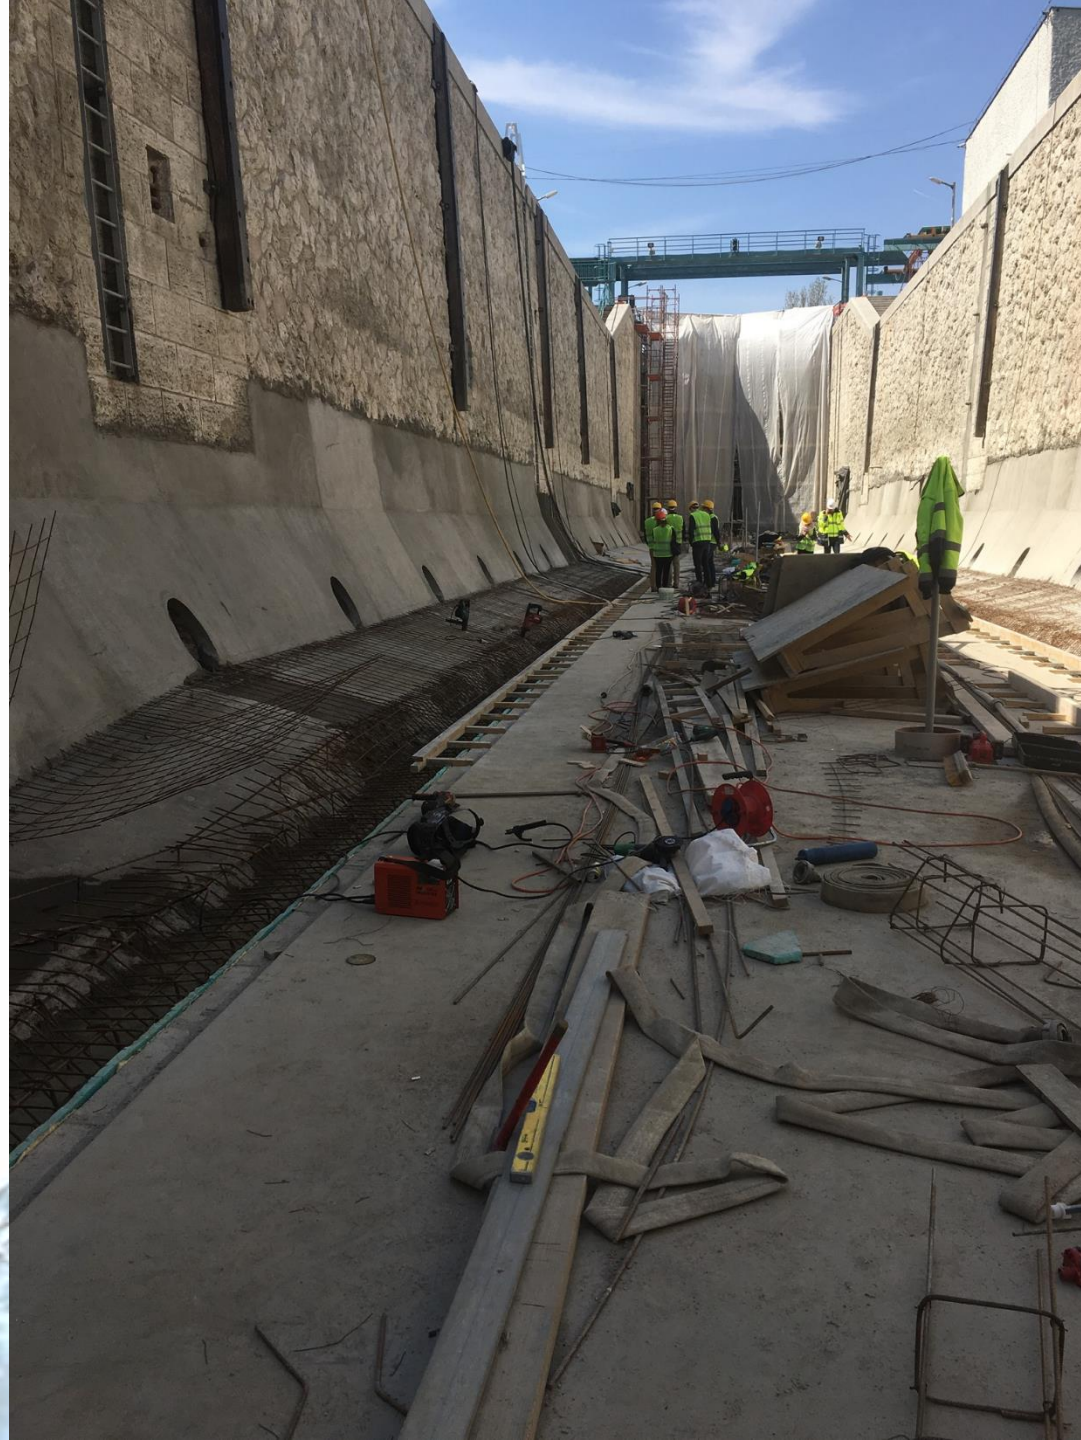












Handwritten text on a white sign attached to the fence.















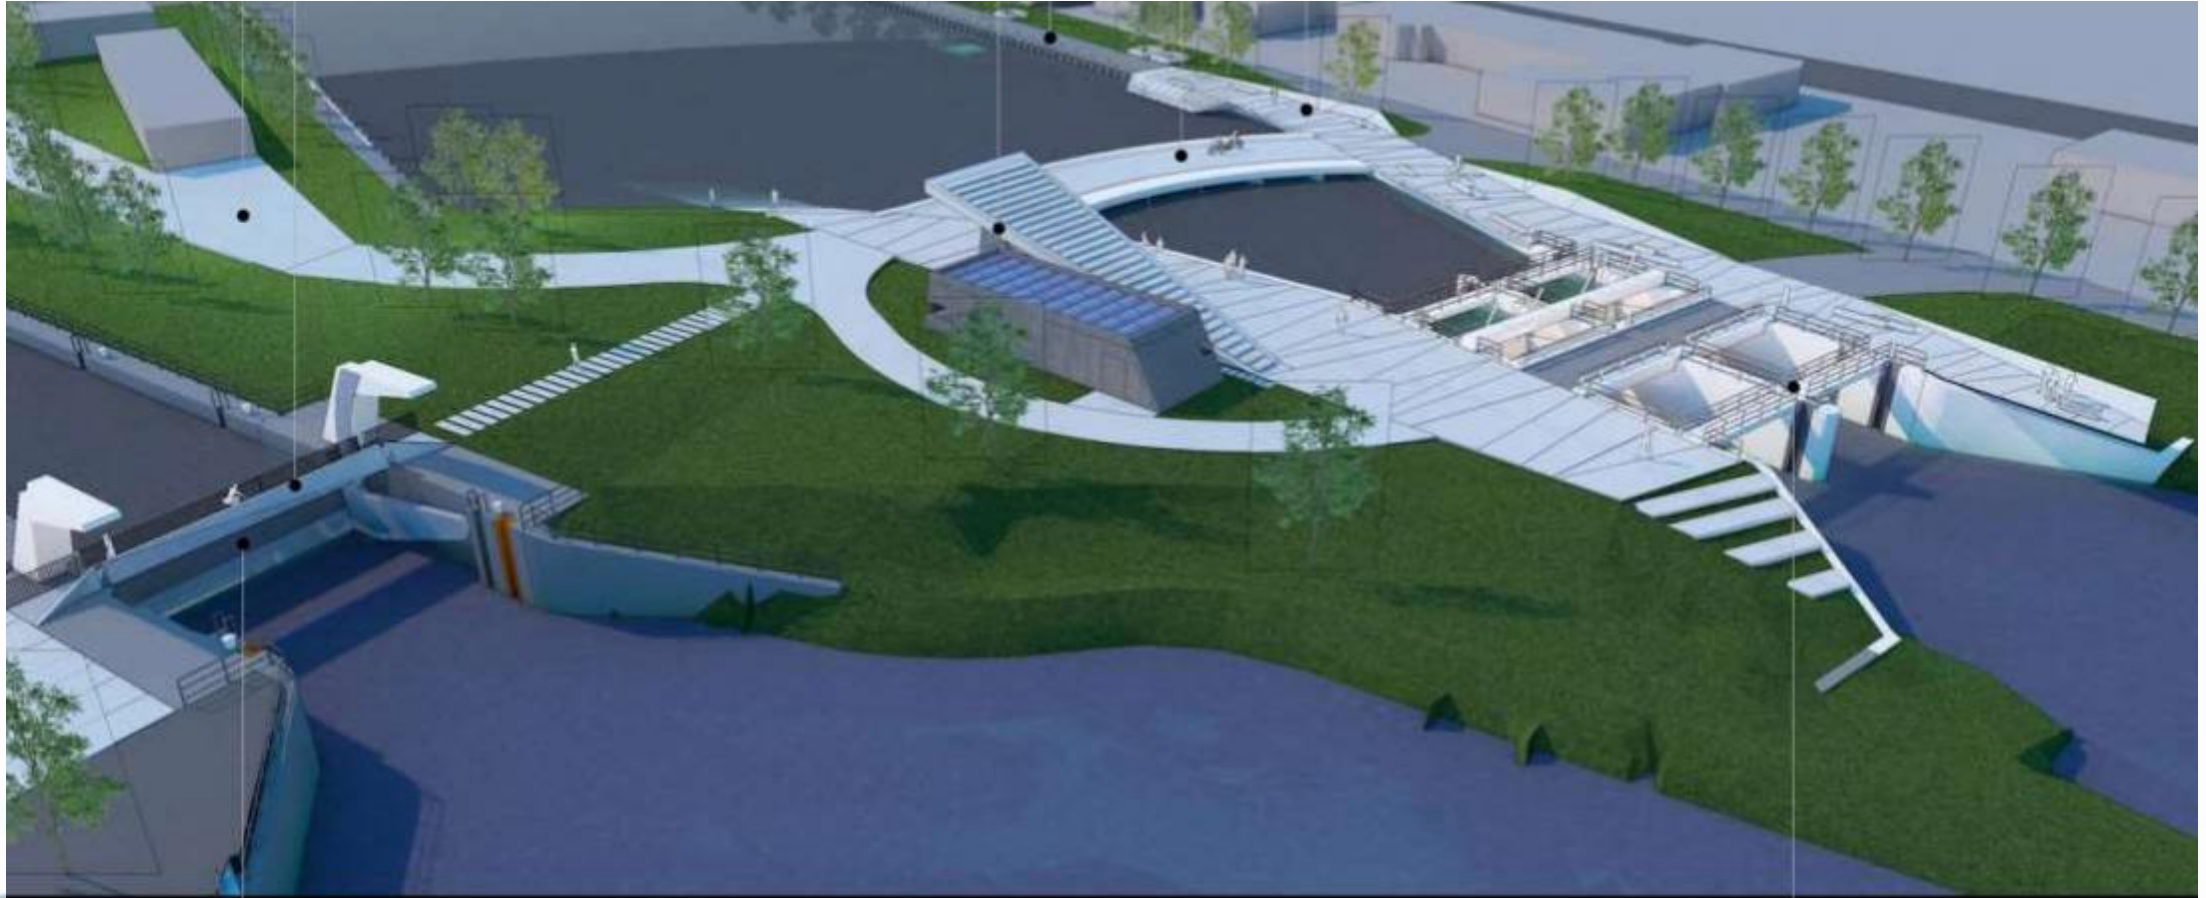

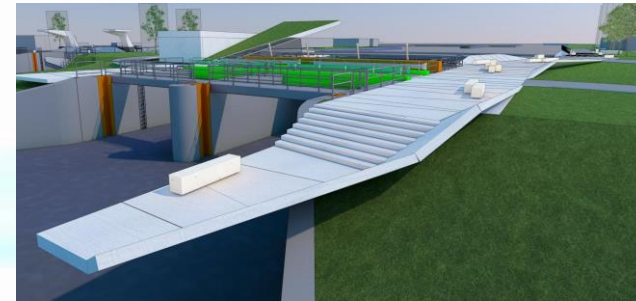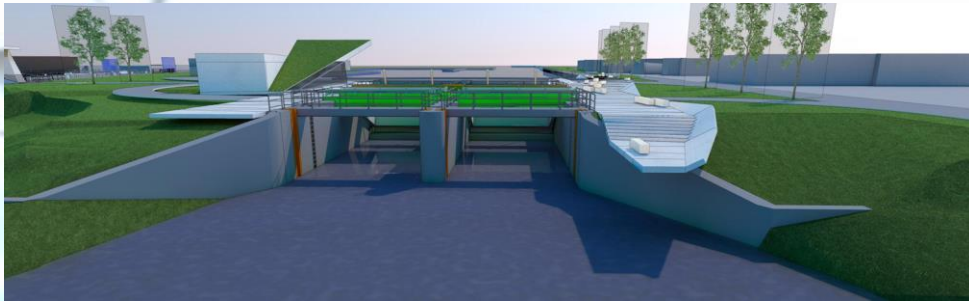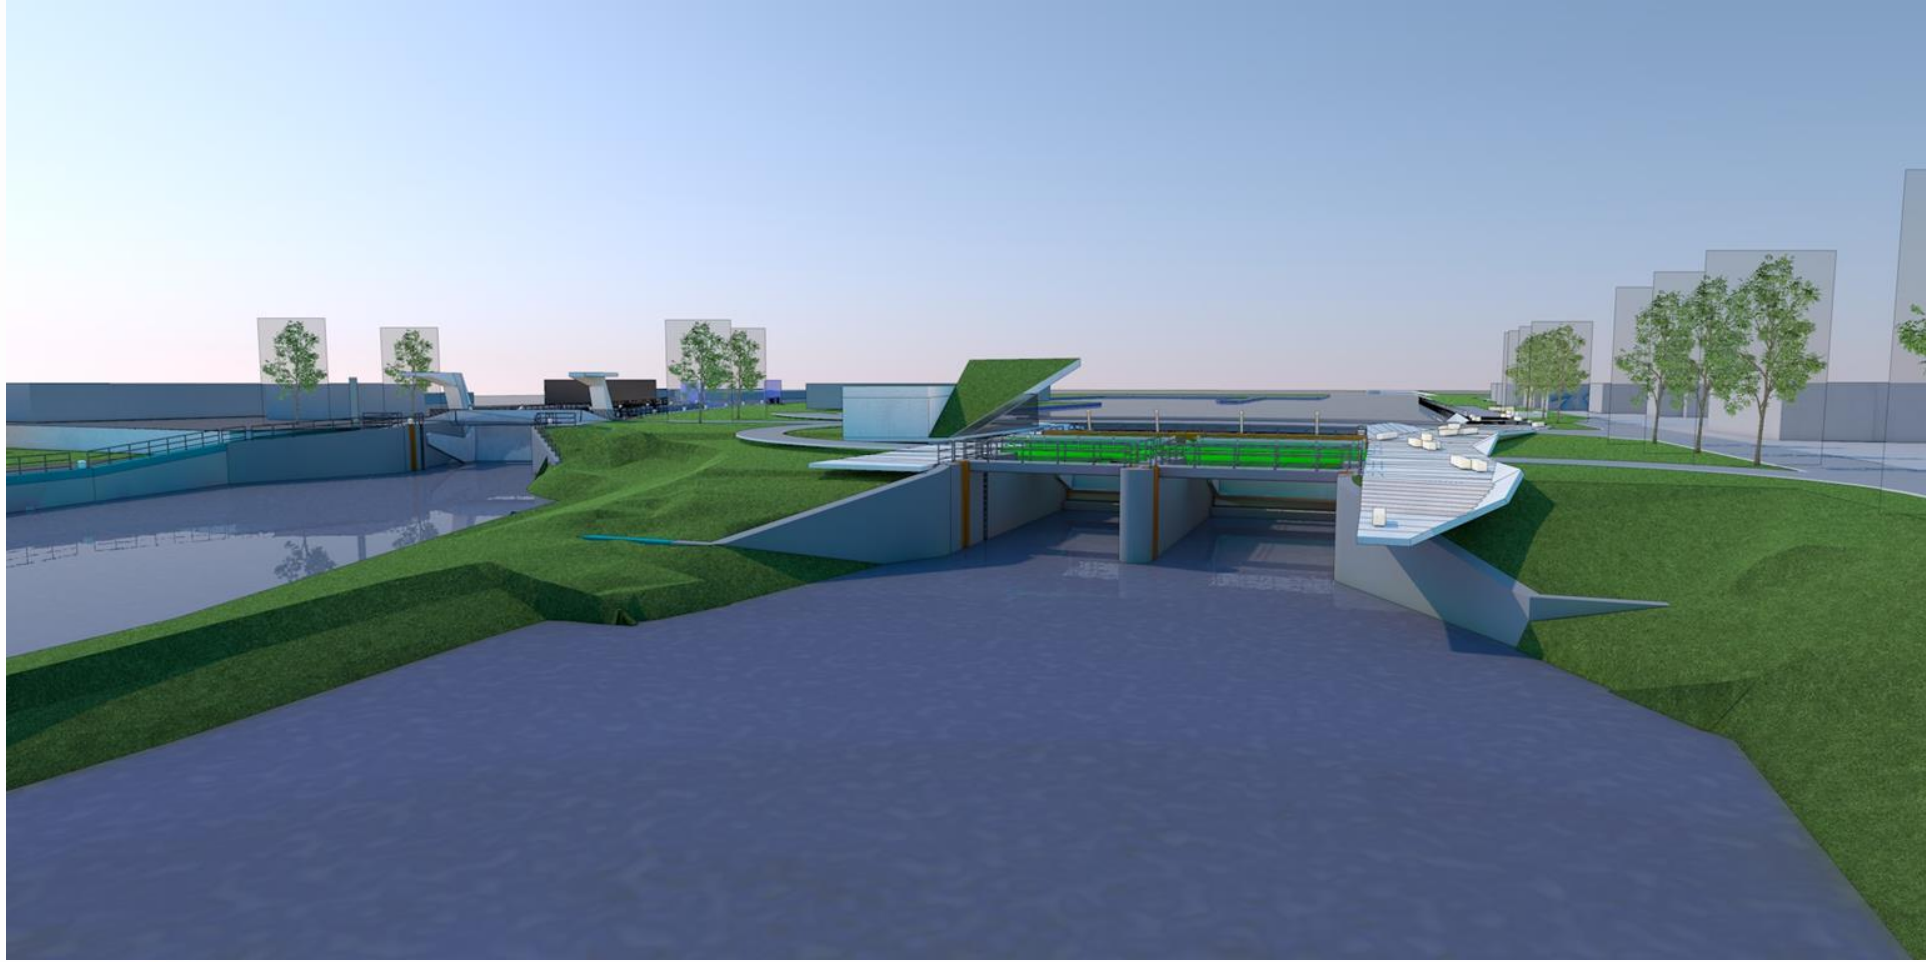

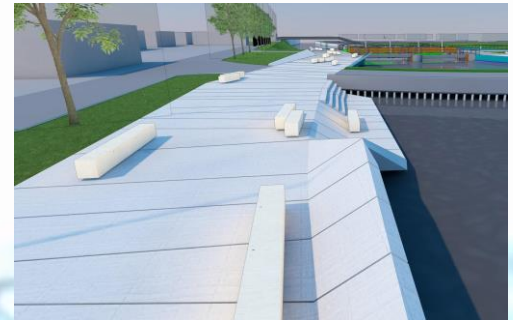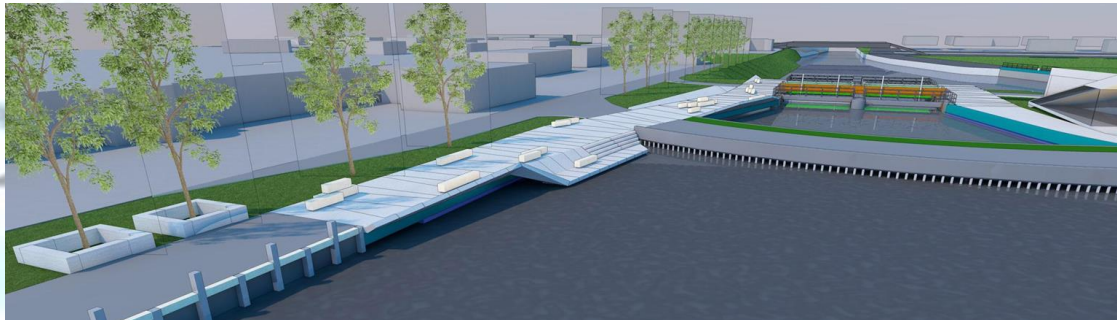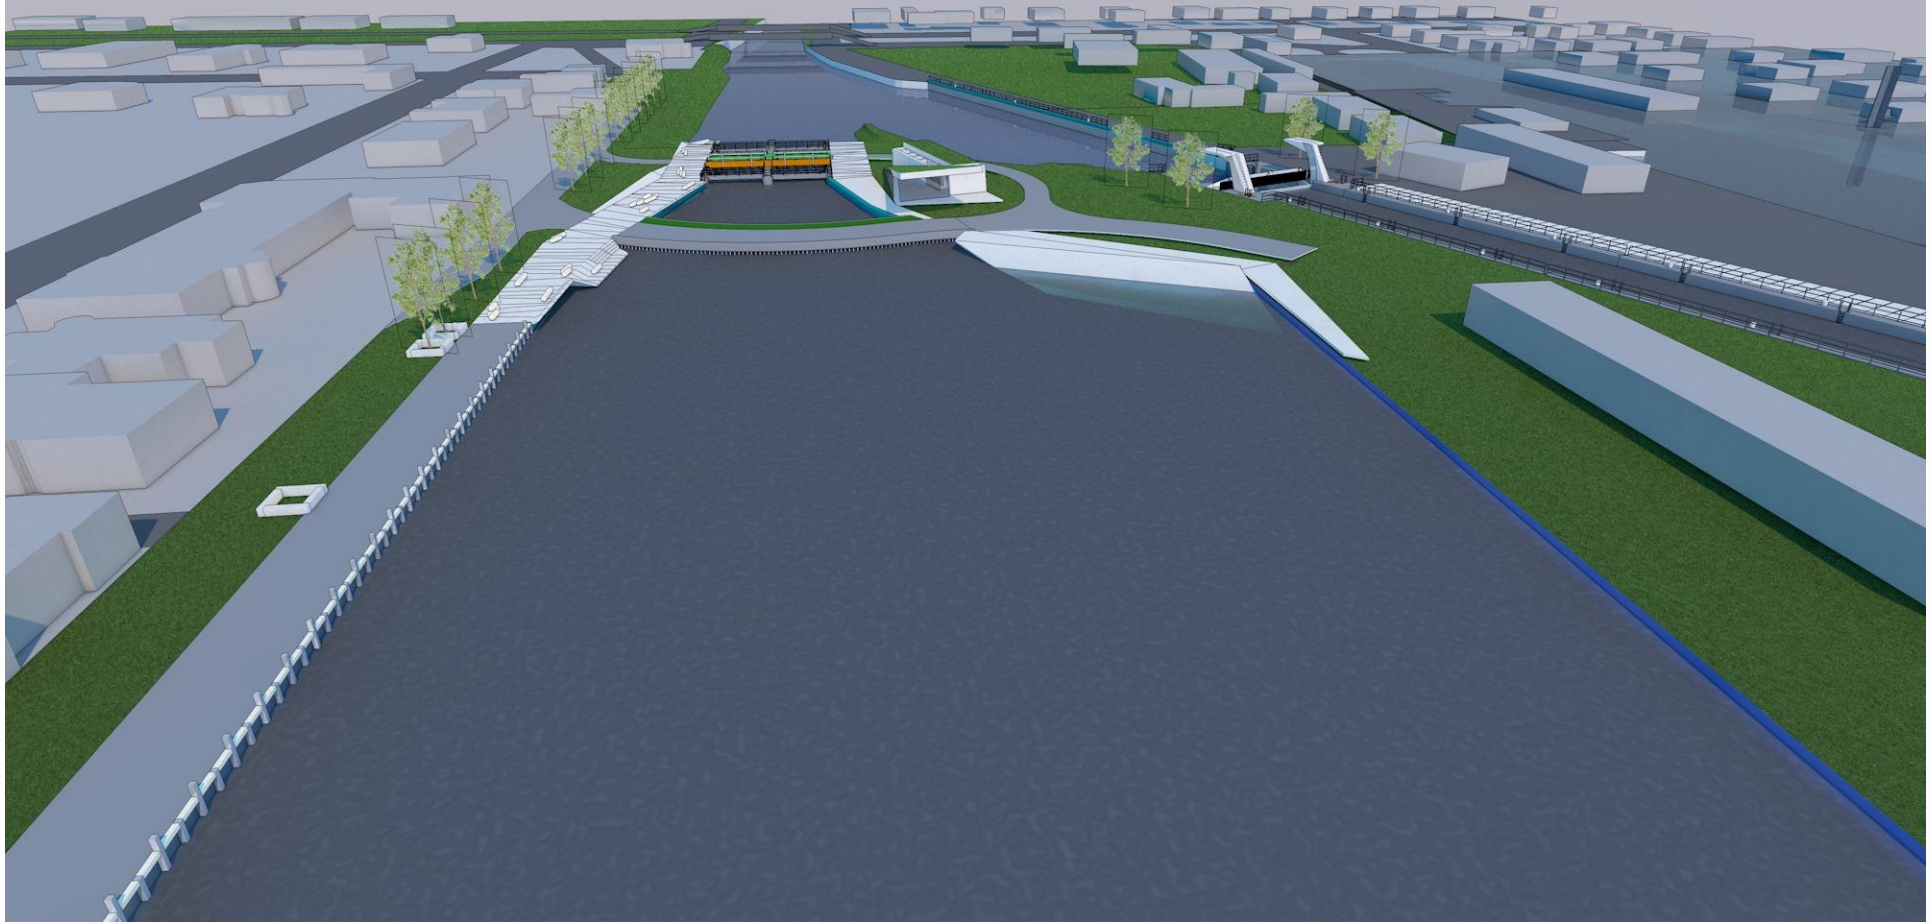

További KEHOP projektek a 2019-2023-ig tartó időszakban

- Előkészítések a 2021-2027 időszakra
 - ÉFK nevesítéssel – csak kiemelt eljárásrend
 - Tervezési időszak 2019-2020
 - Közbeszerzés indítás 2020-2021
 - Előreláthatóan 2019 Q3-ban nevesítésre kerülnek
- Új megvalósítási projektek
 - Megvalósítás 2023-ig (még van +4 év KEHOP-ban)!
 - „Azonnal” indítható és rövid ideig tartó beruházások
 - ÉFK nevesítés nincs napirenden

Felkészülés a 2021-2027 programozási időszakra

- A felmerült problémák, rendszerhibák tanulságainak elemzése (pl. minta szerződések korrigálása)
- 2014-2016 közötti időszakban érdemi előrehaladás alig volt, ezért kormányzati elvárás, hogy a 2021-2027 ciklus átmeneti időszak nélkül induljon
- Építés: Sárga-Piros FIDIC, egyösszegű ajánlat – tételes ajánlat, kockázatok a vállalkozónál – megrendelőnél, melyik az olcsóbb?
Feltételes összeg 10% - 0%?



Köszönöm a figyelmet!

